大阪ボート協会 大阪府立漕艇センター 御中

関西電力送配電株式会社 南大阪電力所

所 長 井口 喜博

担 当 者 : 鈴木 英明 連 絡 先 : 0725-55-0436

工 事 通 知 書

下記のとおり電力設備点検工事を実施しますので宜しくお願いします。


記

I	事	4 名 浜寺共同橋防護板他修繕工事															
I	二 事	事場 所	堺市西区浜寺公園町4 (浜寺大橋共同橋)														
+/:	ы Т <u>-</u>	予定日時	2025 年 11 月 25 日 (月) 9 目														
J. J.	ᄔ	1/足口时	2025 年 12 月 18 日 (木) 17 目														
I	_ 事	目 的	共同橋の電力設備修繕														
I	. 事	ボ 概 要	電力設備修繕														
_	設計	連絡先	関西電力送配電株式会社 南大阪電力所(地中	7送電)													
工事担当	計	担当者	鈴木 英明 電話 070-	-7814-5246													
担当	施	連絡先	兵庫奥栄建設株式会社 大阪支社														
	エ	担当者	加藤 雄三 電話 080-	-5874-3182													
· 「	前																
	.																
孝	与																
Ž	炁 仁	上資 料	・概要図 ・位置図 ・工程表 他														
			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·														

工事概要図

目的


浜寺大橋共同橋の当社送電管路部について防護板表面の剥離が発見された。現在、大阪広域水道企業団側にて浜寺大橋共同橋耐震補強工事を行っており、大規模な防護板取替作業が難しいため、異常がある上流側防護板を取り外し、健全な下流側防護板を上流側へ移設し防護材・遮熱材としての効果を確保する。

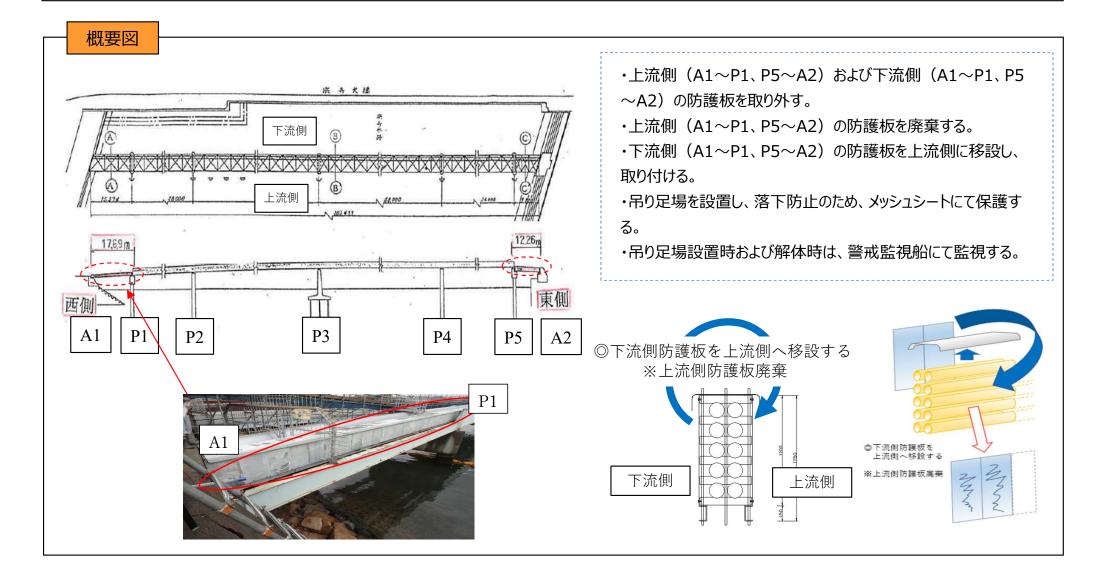


位置図





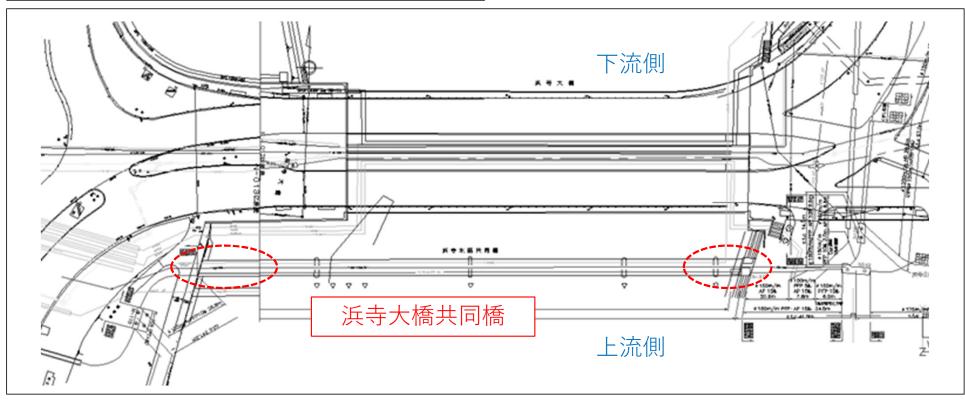

足場組立図

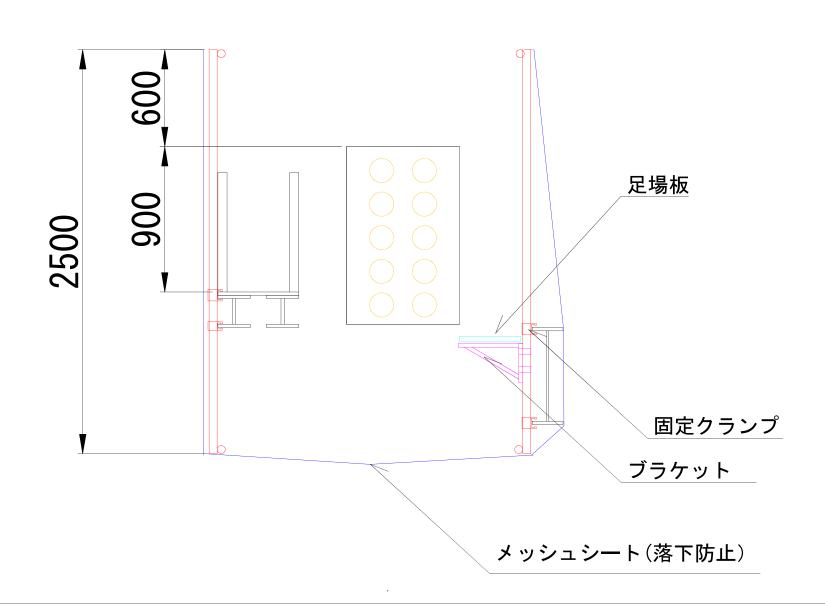

◎A1~P1間吊り足場状況(イメージ図)



◎P5~A2間吊り足場状況及び追加仮設階段設置(イメージ図)



工事件名:浜寺共同橋防護板他修繕工事 兵庫奥栄建設株式会社

Я	2025/11月																															
В	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		備考
工事種別曜	土		月	火	水	木	金	土	В	月	火	水	木	金	土		月	火	水	木	金	土		月	火	水	木	金	土	В		
着手書類作成•施工協議他																																
吊足場設置																																
防護板取り外し・設置																																
足場解体																																
警戒船																																

Я	月 2025/12月																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	備考
工事種別曜日	月	火	水	木	金	土		月	火	水	木	金	土		月	火	水	木	金	土		月	火	水	木	金	土	В	月	火	水	
吊足場設置	予備																															
防護板取り外し・設置																																
足場解体																																
予備日														F	 . 予備E	 . ∃																
警戒船	予備													3	予備 E																	
